



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Dominik Larche

Übung 9

Projekt- & Lifecyclemanagement

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik

Wintersemester 2025/2026

Gesamtübersicht anstehender Übungstermine

Termin	Einheit
09.12.2025	Geschäftsprozesse
16.12.2025	Standardsoftware & Anwendungssysteme
13.01.2025	Individualsoftware + Enterprise Software als Enabler digitaler Geschäftsprozesse
20.01.2026	Projekt- & Lifecyclemanagement
27.01.2026	Cloud Computing & IT-Architekturen
03.02.2026	Requirements Engineering
04.02.2026	Q&A (mit Abt. VII)
11.02.2026	Prüfung

Aufgabe 1:

Projektrollen und Aufgaben

Aufgabe 1: Projektrollen und Aufgaben

Nennen Sie die drei in der Vorlesung genannten Projektrollen und geben Sie zu jeder Rolle eine Aufgabe an.

Aufgabe 1: Projektrollen und Aufgaben

- Lenkungsausschuss
 - Überwacht Projektdurchführung hinsichtlich erbrachter Leistungen, Qualität, Ressourceneinsatz, Termine
- Auftraggeber
 - Gibt Projektziele vor und überprüft diese
- Projektleiter
 - Stimmt sich mit Auftraggeber über alle Belange des Projektes ab

Aufgabe 2:


Gantt-Diagramm

Aufgabe 2: Gantt-Diagramm

Die WIUS24/7 IT GmbH plant die Umsetzung der Software für die automatisierte Korrektur von Klausuren selbst zu entwickeln. Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm, um zu verstehen, wie die einzelnen Arbeitspakete zueinander liegen. Folgende Arbeiten sind zu erledigen.

- Anforderungserhebung
 - Dauer: 1 Woche
 - Ist von keiner anderen Tätigkeit abhängig
- Design
 - Dauer: 2 Wochen
 - Kann erst begonnen werden, wenn alle Anforderungen bekannt sind
- Implementierung
 - Dauer: 5 Wochen
 - Kann erst begonnen werden, wenn die erste Woche des Designs abgeschlossen ist
- Testing
 - Dauer: 4 Wochen
 - Kann frühestens zwei Wochen nach Beginn der Implementierung begonnen werden
- Deployment
 - Dauer: 3 Wochen
 - Kann frühestens eine Woche vor dem Ende der Implementierung begonnen werden
- Dokumentation
 - Dauer: 5 Wochen
 - Kann frühestens mit Beginn der Implementierung starten

Aufgabe 2: Gantt-Diagramm

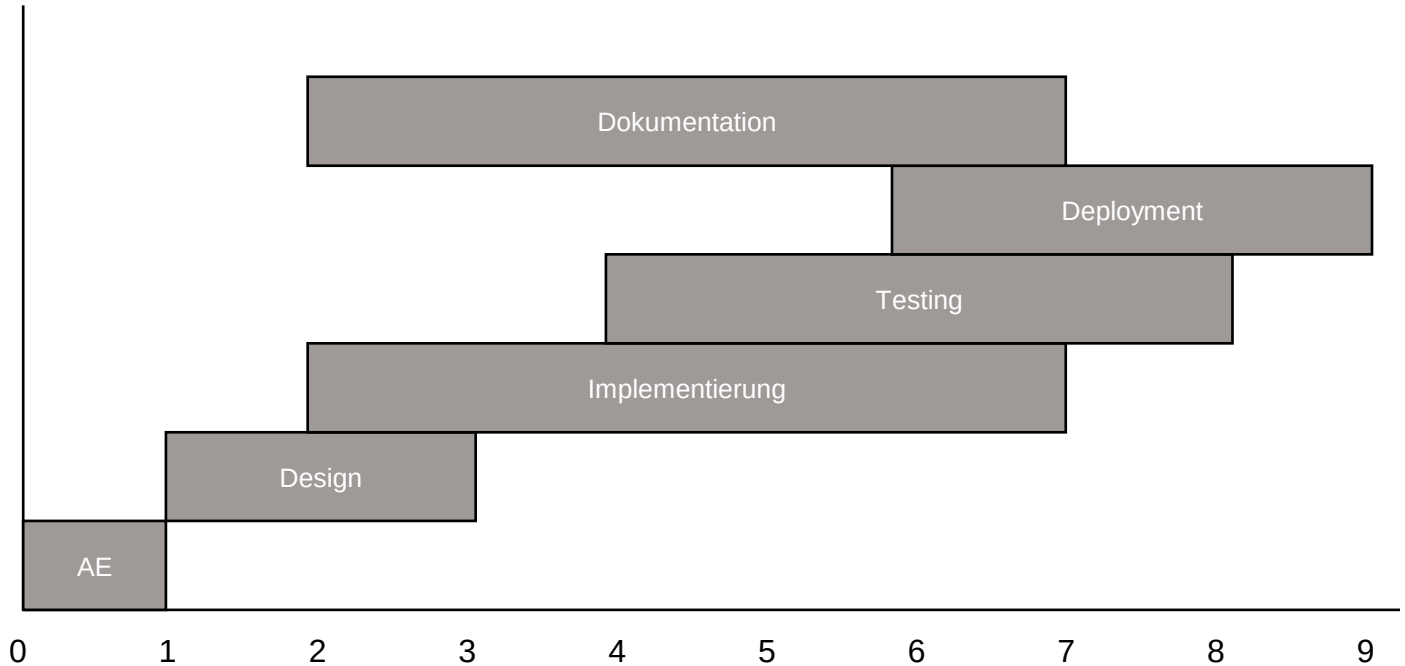

AE = Anforderungserhebung

Aufgabe 3:

Projektstrukturierungsplan (PSP)

Aufgabe 3: Projektstrukturierungsplan (PSP)

Erstellen Sie für ein generisches Softwareentwicklungsprojekt einen prozessorientierten Projektstrukturierungsplan als nummerierte Liste nach dem folgenden Muster.

Muster:

- Phase 1
 - Aufgabe 1
 - Aufgabe 2
 - ...
- Phase 2
 - Aufgabe 1
 - Aufgabe 2
 - ...
- ...
 - ...
 - ...

Aufgabe 3: Projektstrukturierungsplan (PSP)

- Projektstart
 - Projektauftrag klären
 - Stakeholder identifizieren
 - Projektteam zusammenstellen
- Analysephase
 - Anforderungen erheben
 - Anforderungen dokumentieren
 - Anforderungen abstimmen
- Entwicklungsphase
 - Softwarearchitektur entwerfen
 - Programmierung durchführen
 - Code-Reviews durchführen
- Testphase
 - Testfälle erstellen
 - Systemtests durchführen
 - Fehler beheben
- Projektabschluss
 - Abnahme durchführen
 - Projektdokumentation erstellen
 - Projektabschlussbericht verfassen



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Vielen Dank!



Dominik Larche

E-Mail grundlagen-wi@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 685- 82383

Fax +49 (0) 711 685- 82388

Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Dominik Larche

Keplerstraße 17

70174 Stuttgart

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt8
